

1. Kunden-/Anlagendaten

Anlagenname	SP Kiermeier Imming Wurmsham	Anlagenbetreiber	Solarpark Imming Gmbh & Co. Kg	SR-ID	
Angeschlossen an	1000315885 Söllfeld 1	Anschlussvariante	Mittelspannungs-Netzanschluss	Energieparknummer	961273
Energieart	Photovoltaik	Inst. Leistung P _{Inst}	6,498 MW	Wert U>Schutz	21,8 kV Ostbayern
		Scheinleistung S _{Amax}	6,498 MVA		

2. Funktionsprüfung Wirkleistungsanpassung

Sollwertvorgabe	Sollwert rechnerisch	vor der Regelung		nach der Regelung ¹⁾		Wirkleistungsregelung		Kommentar
(% von P _{inst})	P _{Soll} [MW]	P _{akt} [MW]	P _{verfügbar} [MW]	P _{akt} [MW]	P _{akt} /P _{inst} [%]	ΔP [%] ²⁾	Prüfung P ³⁾	
100%	-	-3,30	3,20					
60%	-3,899	-3,30	3,20	-3,30	50,8%	9,2%	erfolgreich	
30%	-1,949	-3,30	3,20	-2,12	32,7%	-2,7%	erfolgreich	
100%	-	-2,12	3,21	-3,33	51,2%	-	erfolgreich	
0%	0,000	-3,33	3,22	-0,08	1,2%	-1,2%	erfolgreich	
100%	-	-0,13	3,23	-3,34	51,4%	-	erfolgreich	
gesamte Funktionsprüfung Wirkleistungsanpassung							erfolgreich	


Sollwert	Messwert
60%	~50%
30%	~32%
100%	~51%
0%	~1.2%
100%	~51%

3. Funktionsprüfung Blindleistungsanpassung (Voraussetzung P_{akt} > 20% P_{inst})

Sollwertvorgabe	vor der Regelung			nach der Regelung ⁴⁾					Blindleistungsregelung		Kommentar
[MVar]	P _{akt} [MW]	Q _{akt} [MVar]	U _{akt} [kV]	P _{akt} [MW]	Q _{akt} [MVar]	U _{akt} [kV]	Q _{akt rech} [MVar] ⁵⁾	U-Grenze	ΔQ [%] ⁶⁾	Prüfung Q ⁷⁾	-
0,000	-3,24	0,020	20,55					-			
kap. -1,319	-3,24	0,020	20,55	-3,28	-1,332	20,62	-1,319	Obergrenze	0,2%	erfolgreich	
kap. -2,144	-3,28	-1,332	20,62	-3,39	-1,447	20,61	-2,144	Obergrenze	0,9%	erfolgreich	
ind. 2,144	-3,39	-1,447	20,74	-3,52	2,113	20,48	2,144	-	0,5%	erfolgreich	
ind. 1,319	-3,52	2,113	20,48	-3,62	1,320	20,51	1,319	-	0,0%	erfolgreich	
0,000	-3,62	1,320	20,51	-3,91	0,020	20,59	0,000	-	0,3%	erfolgreich	
gesamte Funktionsprüfung Blindeleistungsanpassung										erfolgreich	

1) Zeitvorgabe (0,33% von P_{inst}) bis (0,66% P_{inst}) pro Sekunde
 2) Psoll - P_{akt}/P_{inst}
 3) ΔP < 5%
 4) Regelung nach PT1-Verhalten mit 3τ = 15s
 5) rech. Q_{akt} in Abhängigkeit von P_{akt} und Typ der Blindleistungsbereitstellung
 6) (Q_{soll} - Q_{akt})/Q_{inst}
 7) ΔQ ≤ 2% (bei S_{Amax} ≥ 300 kVA) bzw. ≤ 4% (bei S_{Amax} < 300 kVA)

Protokoll der Funktionsprüfung der Wirk- und Blindleistungsanpassung von Erzeugungsanlagen

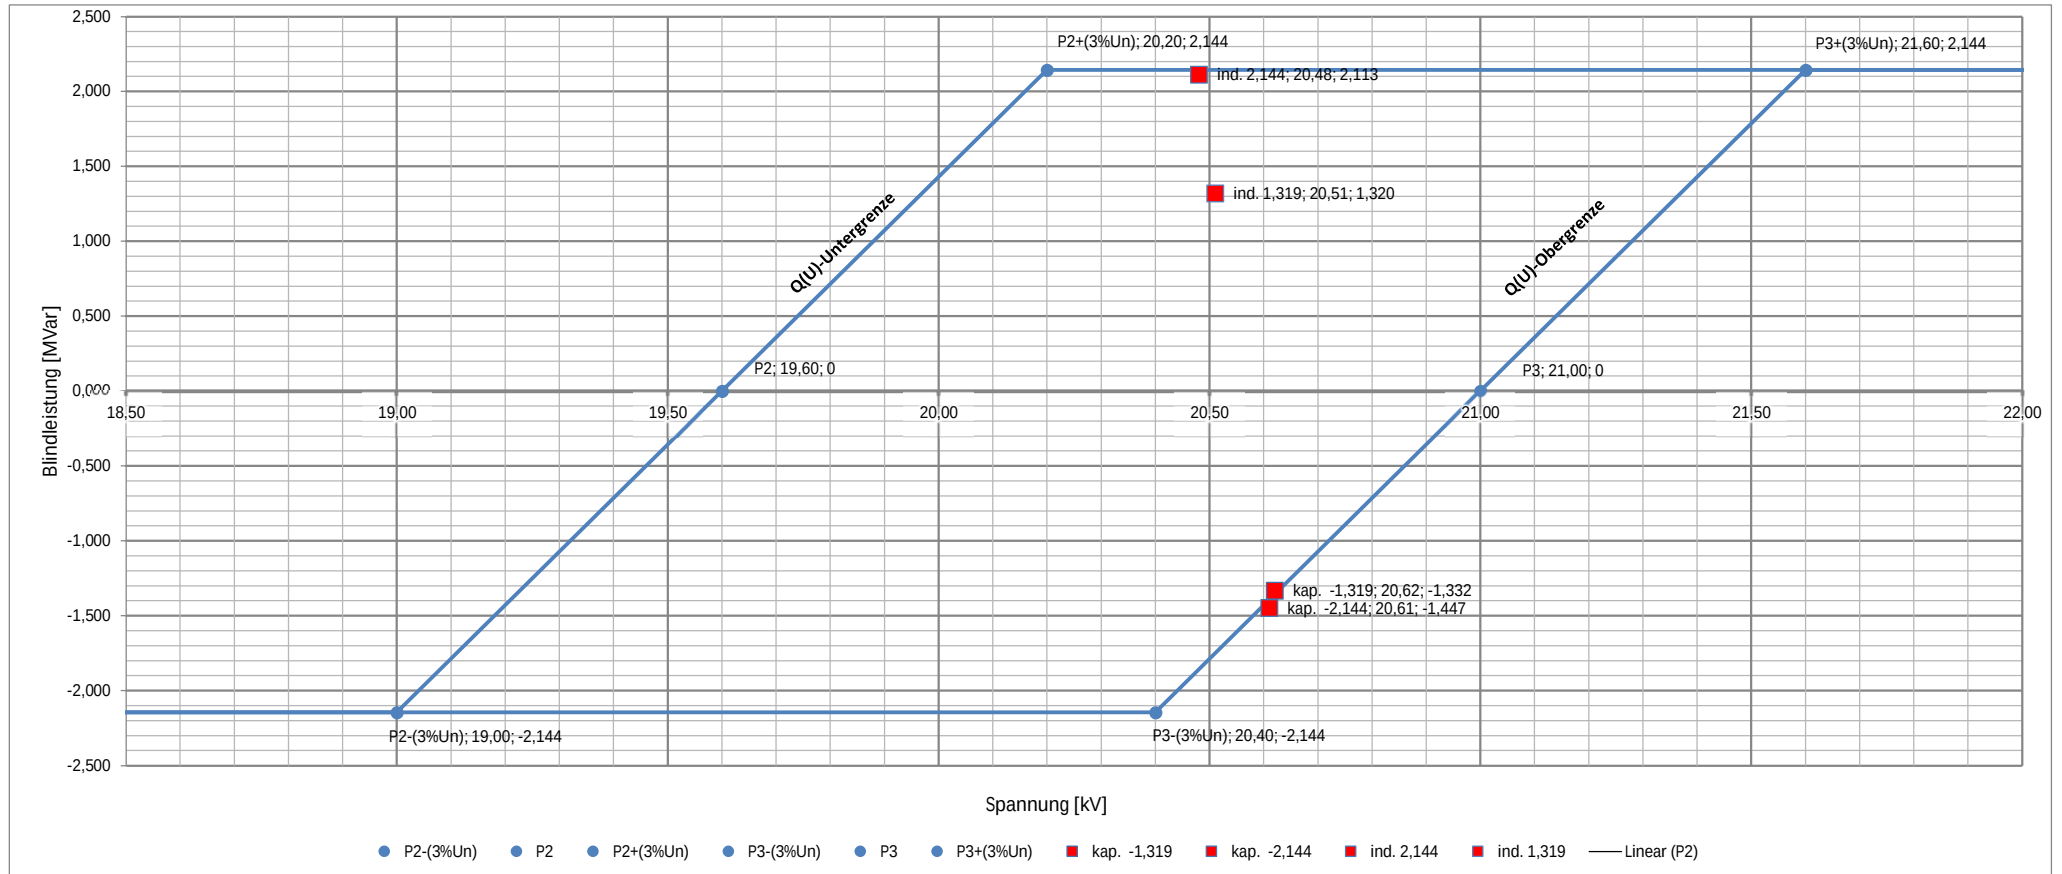

4. Bemerkung bzw. Fehlerbeschreibung bei Nichtbestehen der Funktionsprüfung
